

DR-2026-1121

SAMPLE CO.

A100 · A200 · A300 · C100 …

DR-2026-1121

Contractor A (Civil) · Contractor B (Mech & Piping) · Contractor C (Electrical)

16	11	2	94
الصور	المناطق المزارة		العمالة

SAMPLE CO.

التقرير اليومي للموقع

مشروع نموذجي · محطة ضخ

رقم التقرير
DR-2026-1121
21 تشرين الثاني 2026


سجل الصور حسب المنطقة

1/2 **Injection Manifold A100**



العمل	تنصيب الفالفات — مستمرة
المقاول	Contractor B (Mech & Piping) — قيد التنفيذ · 80%
الوقت · المكان	07:41 · E 510685.2 · N 3535035.3 (38N) ±3 m
ملاحظات	GRP manifold and ball valves installed on bolted steel supports
وسوم	تقدّم

2/2 **Injection Manifold A100**

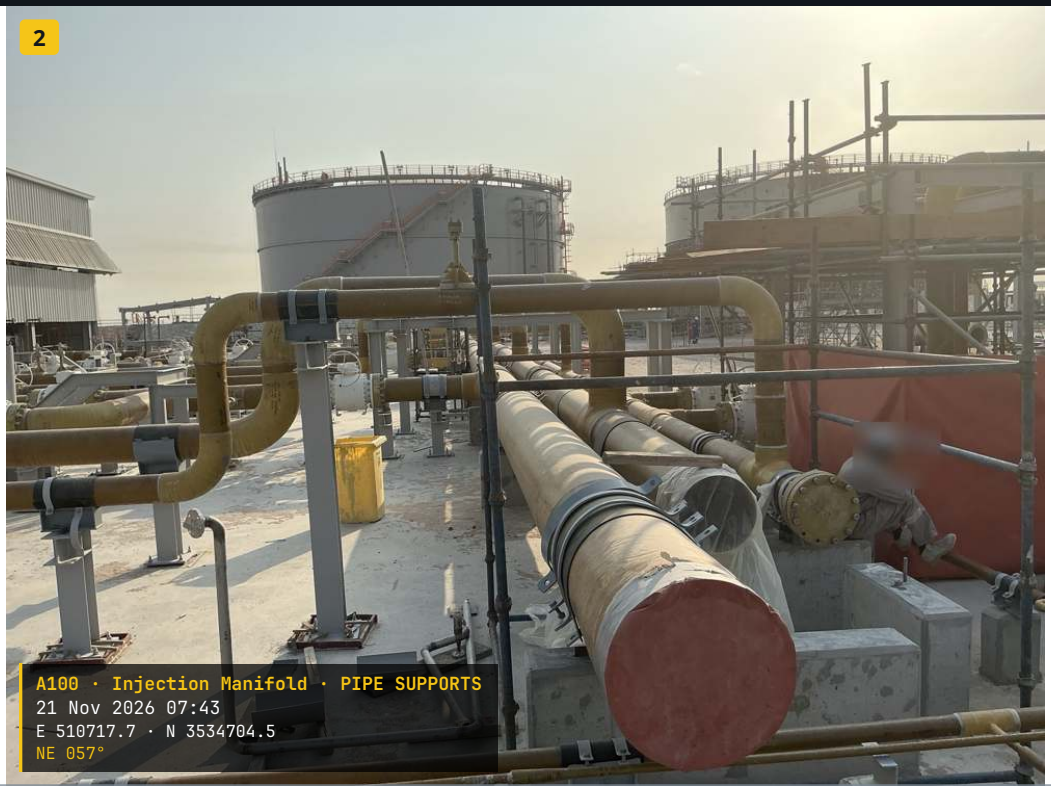


العمل	دعامات الأنابيب — اكتملت
المقاول	Contractor B (Mech & Piping) — قيد التنفيذ · 80%
الوقت · المكان	07:43 · E 510717.7 · N 3534704.5 (38N) ±3 m
ملاحظات	Supports bolted and levelled — ready for inspection
وسوم	جاهز للفحص

1/2 **Pump House A200**



العمل	أعمال الكلادينك — مستمرة
المقاول	Contractor A (Civil) — قيد التنفيذ · 85%
الوقت · المكان	08:05 · E 510653.3 · N 3534826.5 (38N) ±6 m
ملاحظات	Roof and upper cladding complete
وسوم	تقدّم

2/2 **Pump House A200**

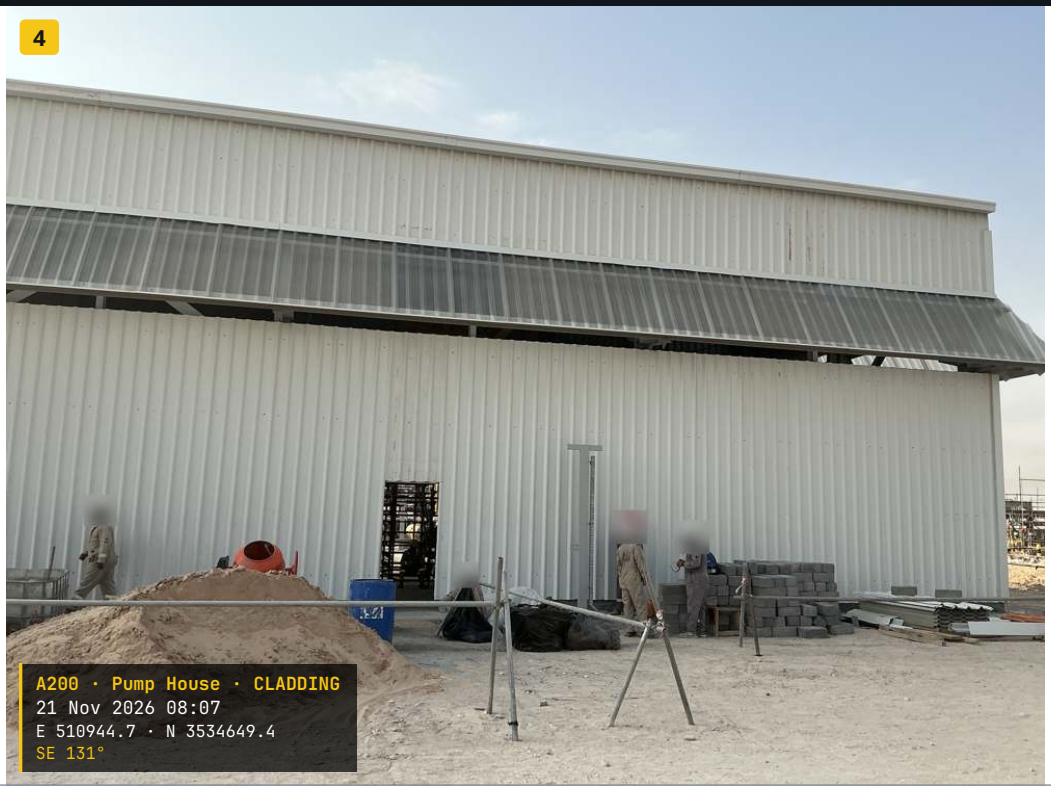

العمل	أعمال الكلادينك — مستمرة
المقاول	Contractor A (Civil) — قيد التنفيذ · 85%
الوقت · المكان	08:07 · E 510944.7 · N 3534649.4 (38N) ±8 m
ملاحظات	East elevation fully clad
وسوم	تقدّم

1/2	Shelter & Headers A300



العمل	⚓ نصب الهياكل الحديدية — اكتملت
المقاول	Contractor B (Mech & Piping) قيد التنفيذ · 70%
الوقت · المكان	08:30 · E 510758.9 · N 3534571.5 (38N) ±7 m
ملاحظات	Shelter steel complete
وسوم	تقدّم


2/2 **Shelter & Headers A300**



العمل	تنصيب البايبات — مستمرة
المقاول	Contractor B (Mech & Piping) — قيد التنفيذ · 70%
الوقت · المكان	08:32 · E 510964.4 · N 3534530.5 (38N) ±9 m
ملاحظات	CS headers and GRP lines on pipe supports
وسوم	تقدّم


1/2

Pump Foundations C100

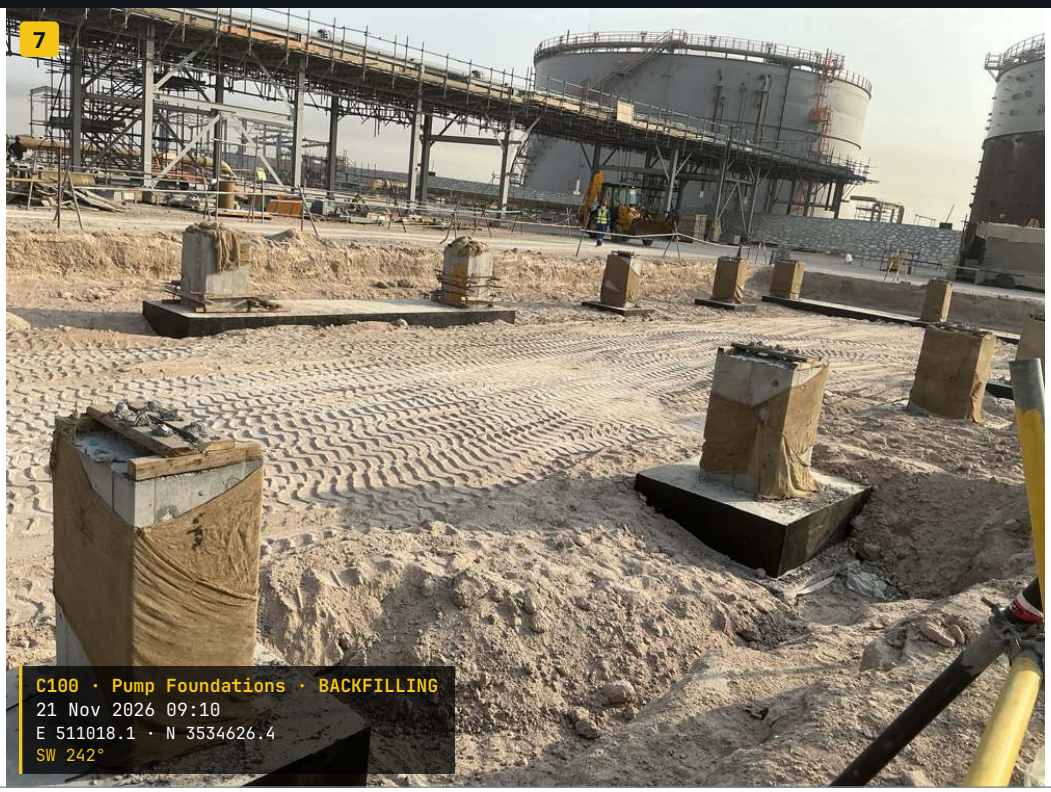

العمل	أعمال الدفن — مستمرة
المقاول	Contractor A (Civil) — قيد التنفيذ · 60%
الوقت · المكان	09:10 · E 511018.1 · N 3534626.4 (38N) ±8 m
ملاحظات	ردم الطبقة الثانية حول قواعد المضخات
وسوم	تقدّم


2/2 **Pump Foundations** C100

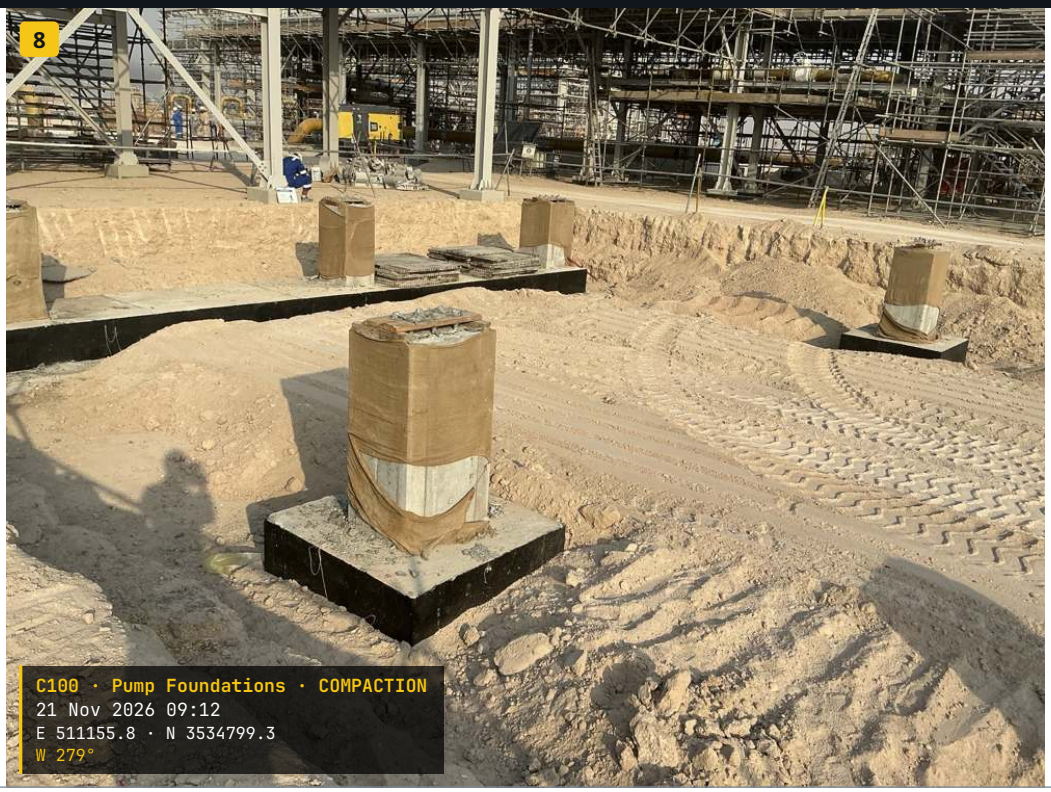

العمل	أعمال الحدل — مستمرة
المقاول	Contractor A (Civil) **قيد التنفيذ · 60%**
الوقت · المكان	09:12 · E 511155.8 · N 3534799.3 (38N) ±5 m
ملاحظات	Compaction around pedestal footings
وسوم	**تقدّم**

1/1

Skid Foundations C400

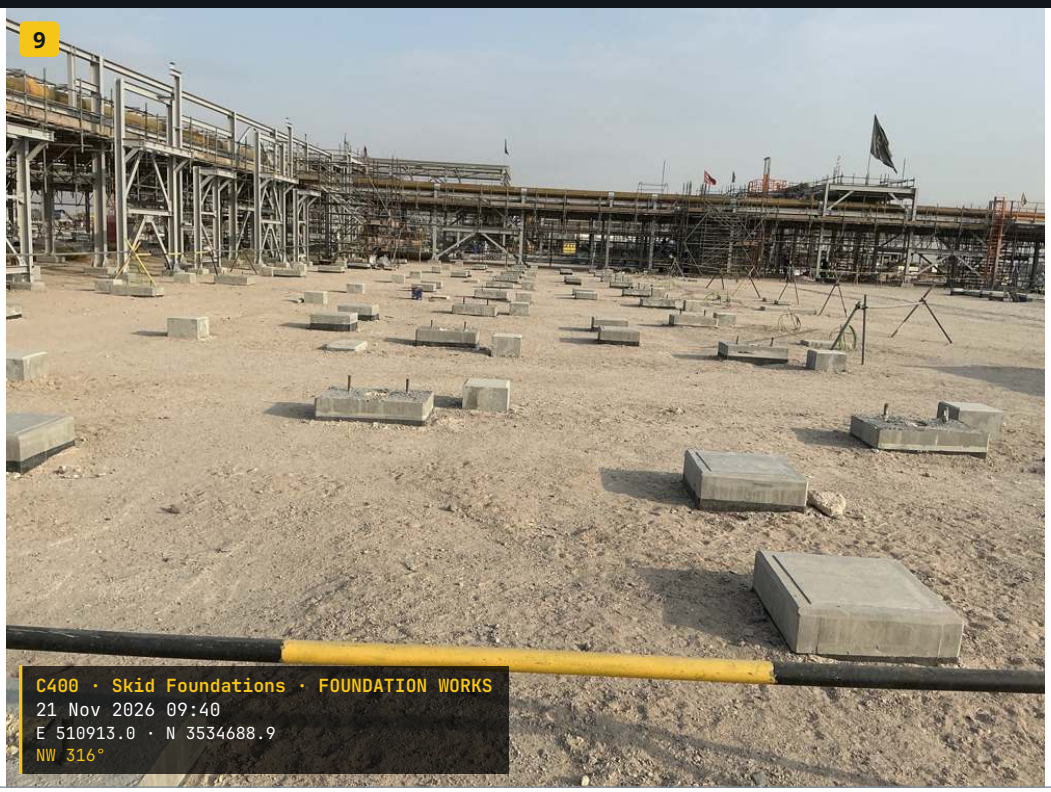

العمل	أعمال الأساسات — اكتملت
المقاول	Contractor A (Civil) جاهز للمرحلة التالية
الوقت · المكان	09:40 · E 510913.0 · N 3534688.9 (38N) ±7 m
ملاحظات	Skid and pipe-support foundations complete and backfilled
وسوم	جاهز للفحص

1/2


Pipe Rack P340



العمل	أعمال الكراوت — اكتملت
المقاول	Contractor B (Mech & Piping) — قيد التنفيذ · 75%
الوقت · المكان	10:05 · E 510793.3 · N 3535035.8 (38N) ±8 m
ملاحظات	Rack steel erected, base plates grouted
وسوم	تقدّم

2/2

Pipe Rack P340

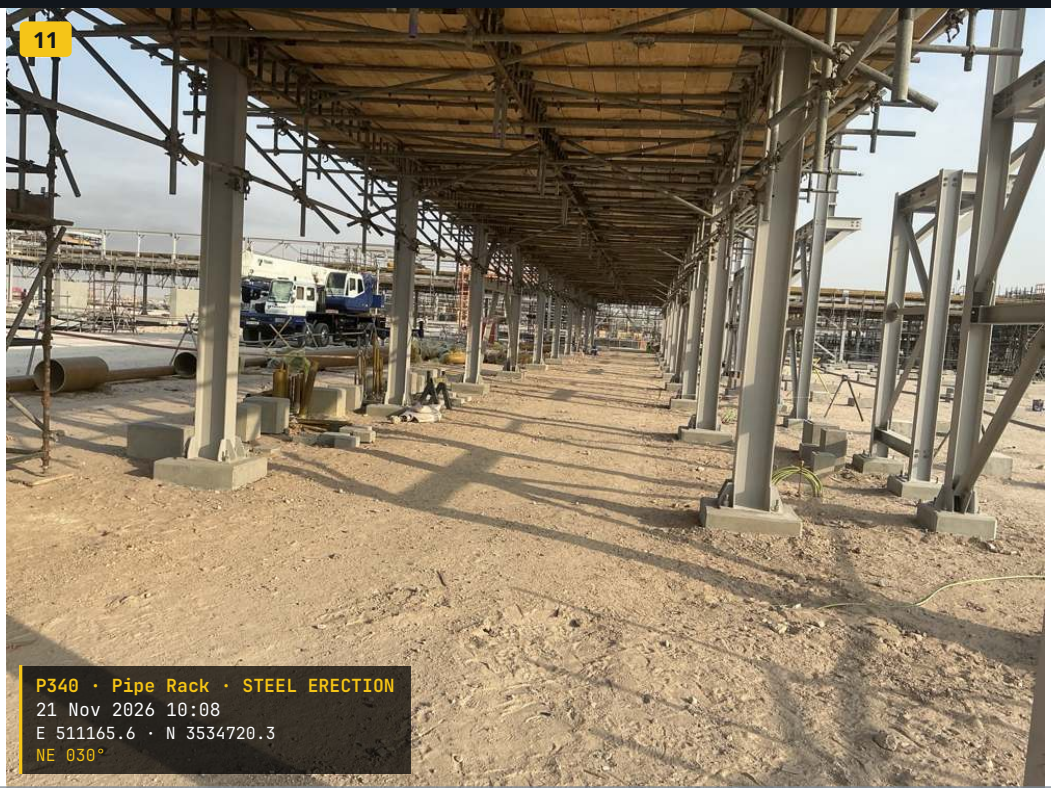

العمل	⚓ نصب الهياكل الحديدية — مستمرة
المقاول	Contractor B (Mech & Piping) **قيد التنفيذ · 75%**
الوقت · المكان	10:08 · E 511165.6 · N 3534720.3 (38N) ±4 m
ملاحظات	Steel erected along the rack
وسوم	**تقدّم**


1/1 **Cable Trench E300**



العمل	خندق الكابلات — متوقفة
المقاول	Contractor C (Electrical) — قيد التنفيذ · 40%
الوقت · المكان	10:40 · E 511083.9 · N 3534819.8 (38N) ±8 m
ملاحظات	خندق مفتوح بدون حواجز كافية — يحتاج حواجز وإشارات
وسوم	سلامة

1/1


UG Fire Water Line **G300**

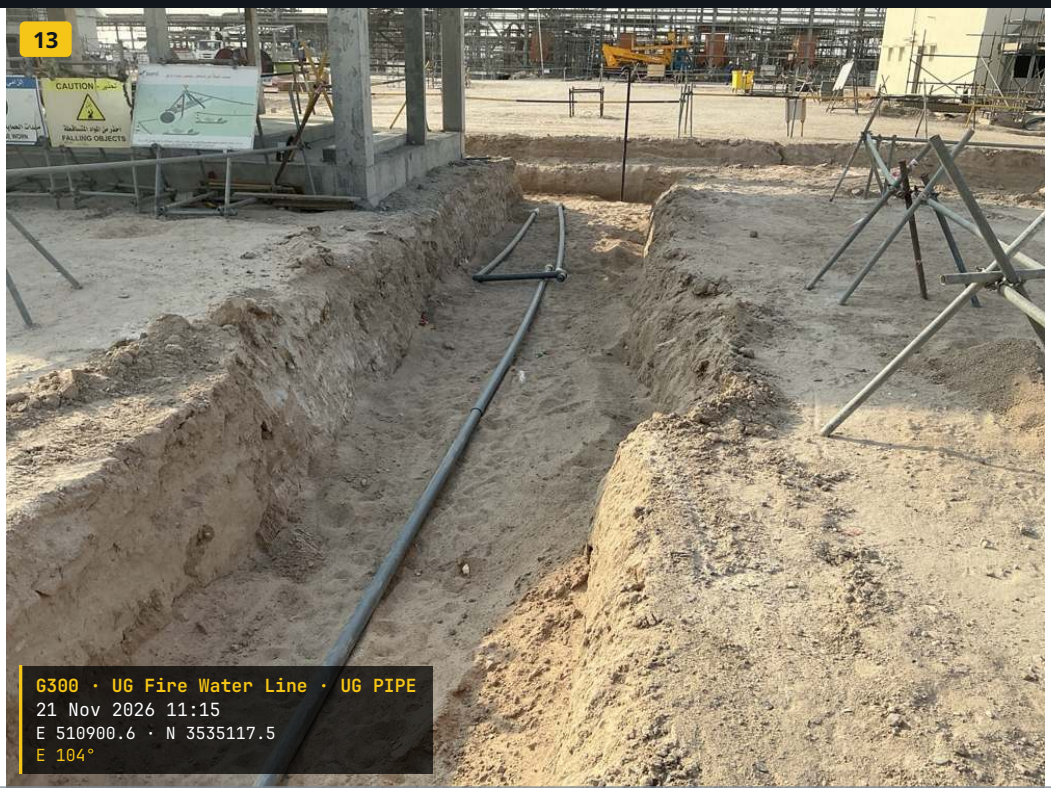

العمل	الأنابيب تحت الأرض — مستمرة
المقاول	Contractor A (Civil) — قيد التنفيذ · 55%
الوقت · المكان	11:15 · E 510900.6 · N 3535117.5 (38N) ±3 m
ملاحظات	نقطة HOLD: فحص الفرشة والمنسوب قبل الردم
وسوم	سلامة

1/1

Water Tank A510

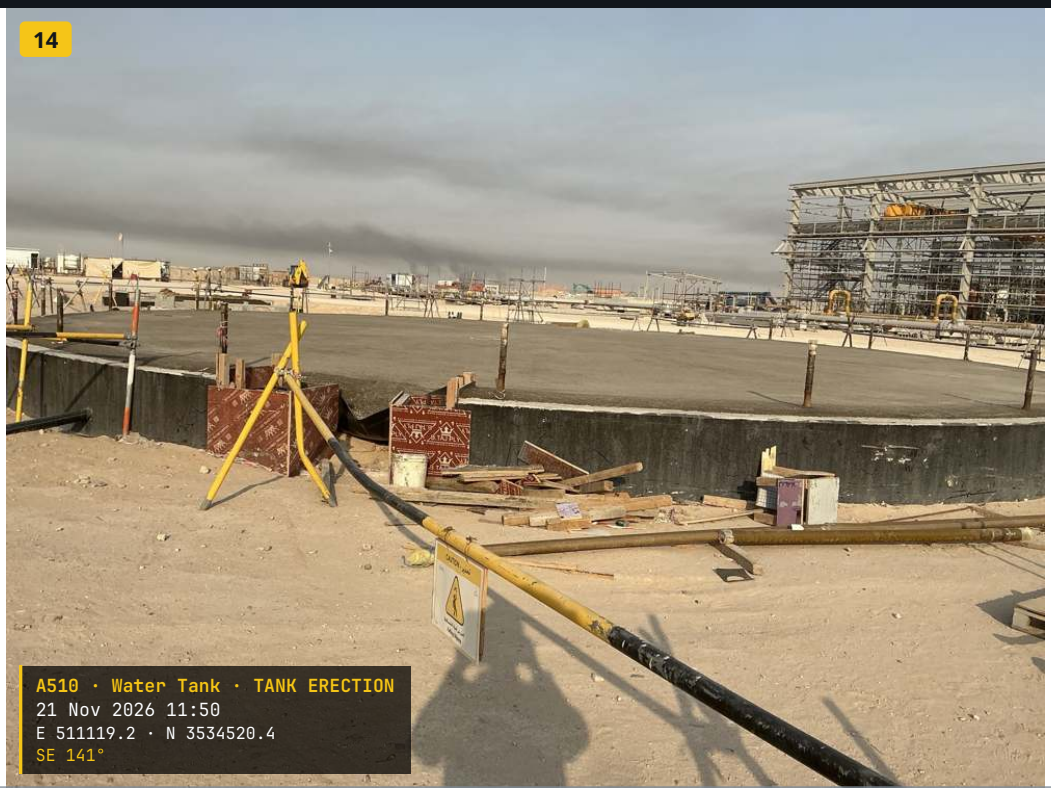

العمل	تنصيب الخزانات — اكتملت
المقاول	Contractor B (Mech & Piping) جاهز للمرحلة التالية
الوقت · المكان	11:50 · E 511119.2 · N 3534520.4 (38N) ±6 m
ملاحظات	Ring wall and tank pad complete
وسوم	جاهز للفحص

1/1 **Control Building** B400



العمل	صب الخرسانة — مستمرة
المقاول	Contractor A (Civil) — قيد التنفيذ · 65%
الوقت · المكان	12:20 · E 510962.1 · N 3534609.5 (38N) ±4 m
ملاحظات	RC frame and roof slab complete
وسوم	تقدّم

Evaporation Pond 1/1



العمل	أعمال تسوية وتحضير الموقع — مستمرة
المقاول	Contractor A (Civil) — قيد التنفيذ · 50%
الوقت · المكان	12:45 · E 510857.5 · N 3534980.3 (38N) ±4 m
ملاحظات	Dike wall and stone pitching complete
وسوم	ملاحظة

المشروع	مشروع نموذجي · محطة ضخ	التاريخ	21 تشرين الثاني 2026
جولة الموقع	07:41 – 12:45	المقاولون	Contractor A (Civil) (Civil works) · Contractor B (Mech & Piping) (Mechanical & piping) · Contractor C (Electrical) (Electrical)
الطقس	حار · 41°C · الرياح 6.4 م/ثا (23 كم/س)	أعدّه	مهندس الموقع
مقدّم إلى	العميل · فريق إدارة المشروع	العمال	94

11	16	2	16	2	94
المناطق المزارة	الصور	بنود السلامة	الملاحظات	جاهز للفحص	العمالة

ملخص اليوم

- تم فحص 11 منطقة خلال جولة الموقع؛ وسُجلت 16 صورة مرتبة حسب المنطقة.
- جاهز للمرحلة التالية: C400, A510
- مستمر: A100; A200; A300; C100; P340; E300
- السلامة: 2 — E300, G300
- لا يوجد عمل اليوم: E300 (بانتظار تصريح العمل)
- العمال في الموقع: 94

المناطق اليوم

المنطقة	اسم المنطقة	المقاول	الحالة	اليوم	صور · ملاحظات
A100	Injection Manifold	Contractor B (Mech & Piping)	قيد التنفيذ · 80% المخطط الكلي 85% · متأخر −5 +8% عن آخر يوم	تنصيب الفالفات — مستمرة GRP manifold and ball valves installed on bolted steel supports دعامات الأنابيب — اكتملت	2 · 2

المنطقة	اسم المنطقة	المقاول	الحالة	اليوم	صور · ملاحظات
A200	Pump House	Contractor A (Civil)	قيد التنفيذ · 85% المخطط الكلي 80% · متقدم +5 +7% عن آخر يوم	أعمال الكلادينك — مستمرة Roof and upper cladding complete East elevation fully clad	2 · 2
A300	Shelter & Headers	Contractor B (Mech & Piping)	قيد التنفيذ · 70% المخطط الكلي 75% · متأخر −5 +6% عن آخر يوم	نصب الهياكل الحديدية — اكتملت Shelter steel complete تنصيب البايبات — مستمرة	2 · 2
C100	Pump Foundations	Contractor A (Civil)	قيد التنفيذ · 60% المخطط الكلي 65% · متأخر −5 +8% عن آخر يوم	أعمال الدفن — مستمرة ردم الطبقة الثانية حول قواعد المضخات أعمال الحدل — مستمرة	2 · 2
C400	Skid Foundations	Contractor A (Civil)	جاهز للمرحلة التالية	أعمال الأساسات — اكتملت Skid and pipe-support foundations complete and backfilled	1 · 1
P340	Pipe Rack	Contractor B (Mech & Piping)	قيد التنفيذ · 75% المخطط الكلي 75% · متقدم +0 +5% عن آخر يوم	أعمال الكراوت — اكتملت Rack steel erected, base plates grouted نصب الهياكل الحديدية — مستمرة	2 · 2
E300	Cable Trench	Contractor C (Electrical)	قيد التنفيذ · 40% المخطط الكلي 50% · متأخر −10 بدون تغيير عن آخر يوم	لا يوجد عمل اليوم — بانتظار تصريح العمل خندق الكابلات — متوقفة خندق مفتوح بدون حواجز كافية — يحتاج حواجز وإشارات	1 · 1
G300	UG Fire Water Line	Contractor A (Civil)	قيد التنفيذ · 55% المخطط الكلي 60% · متأخر −5 +5% عن آخر يوم	الأنابيب تحت الأرض — مستمرة نقطة HOLD: فحص الفرشة والمنسوب قبل الردم	1 · 1
A510	Water Tank	Contractor B (Mech & Piping)	جاهز للمرحلة التالية	تنصيب الخزانات — اكتملت Ring wall and tank pad complete	1 · 1
B400	Control Building	Contractor A (Civil)	قيد التنفيذ · 65% المخطط الكلي 60% · متقدم +5 +7% عن آخر يوم	صب الخرسانة — مستمرة RC frame and roof slab complete	1 · 1
Evaporation Pond		Contractor A (Civil)	قيد التنفيذ · 50%	أعمال تسوية وتحضير الموقع — مستمرة Dike wall and stone pitching complete	1 · 1

الحالة والنسبة يحدّدها مهندس الموقع؛ المناطق غير المحدّثة تحتفظ بآخر قيمة.

خطة الغد

المنطقة	العمل المخطط	الكوادر والآليات	يحتاج
A200 Pump House	أعمال الكلادينك · أعمال الصبغ · Finish west elevation cladding · PTW-2214	مشرف 1 · فاتح تصاريح 1 PA · فنيون 8 · ريكري 1 · فلاك مان 1 · رافعة 1 · رافعة أفراد 2	تصريح
C100 Pump Foundations	أعمال الحدل · صب الخرسانة · Field density test then blinding · RFI-118	مشرف 1 · مشغّلون 2 · عمّال 8 · مسعف 1 · حادلة 1 · صهريج ماء 1	فحص / RFI · مواد
E300 Cable Trench	خندق الكابلات · Install barriers and signs before any work	مشرف 1 · عمّال 4 · إطفائي 1	تصريح · عمالة

المشاكل والتأخير

رقم	المشكلة / التأخير	المنطقة	الجهة	من تاريخ	أيام
1	Barriers missing along the open cable trench	E300	Contractor C (Electrical)	17-11	5
2	Waiting for GRP fittings delivery	A100	Contractor B (Mech & Piping)	20-11	2
3	Crane certificate expired أغلقت اليوم	P340	Contractor B (Mech & Piping)	19-11	3

الفحوصات والمواد

النوع	الوصف	المنطقة	النتيجة

النوع	الوصف	المنطقة	النتيجة
فحص	Concrete cubes 7-day — 31.5 MPa	B400	ناجح
فحص	Field density test — 96 %	C100	ناجح
فحص	Holiday test on UG line	G300	بالانتظار
مواد	Rebar 16 mm — 12 t delivered	B400	—

العمال والمعدات

المقاول	الاختصاص	المنطقة	العمال	المعدات الرئيسية
Contractor B (Mech & Piping)	Mechanical & piping	A100 · A300 · P340	32	1 رافعة · 2 ماكينة لحام
Contractor A (Civil)	Civil works	A200 · C100 · G300 · B400	62	1 رافعة · 2 رافعة أفراد · 1 حادلة · 1 شفل · 1 صهريج ماء · 1 حفّارة · 2 خلاطة خرسانة · 1 مضخة خرسانة

بنود السلامة · تُقرأ أولاً

رقم	المنطقة	الملاحظة	الوقت
S-01	E300	خندق مفتوح بدون حواجز كافية — يحتاج حواجز وإشارات	10:40
S-02	G300	نقطة HOLD: فحص الفرشة والمنسوب قبل الردم	11:15

جاهز للمرحلة التالية

المنطقة	العمل	الحالة
A100	تنصيب الفالفات — مستمرة · دعامات الأنابيب — اكتملت · Supports bolted and levelled — ready for inspection	قيد التنفيذ · 80%
C400	أعمال الأساسات — اكتملت · Skid and pipe-support foundations complete and backfilled	جاهز للمرحلة التالية
A510	تنصيب الخزانات — اكتملت · Ring wall and tank pad complete	جاهز للمرحلة التالية

قبل وبعد

Pump House A200



قبل · 19 تشرين الثاني 2026



بعد · 21 تشرين الثاني 2026

Shelter & Headers A300



قبل · 19 تشرين الثانى 2026




بعد · 21 تشرين الثانى 2026

Pump Foundations C100



قبل · 19 تشرين الثانى 2026

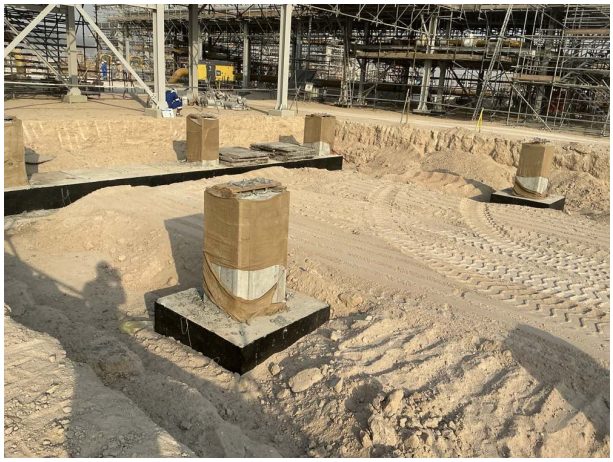

بعد · 21 تشرين الثانى 2026

Control Building B400



قبل · 19 تشرين الثانى 2026



بعد · 21 تشرين الثانى 2026

أعدّه · مهندس الموقع	ممثل المقاول	الاستشارى / الشركة · العميل · فريق إدارة المشروع
