التقرير الشهري للموقع

مشروع نموذجي · محطة ضخ

الفترة: 23 تشرين الأول 2026 — 21 تشرين الثاني 2026 · 30 يوم

SAMPLE CO.

أعدّه: مهندس الموقع

إلى: العميل · فريق إدارة المشروع

2	20	11	+4%	94	1
أيام العمل	الصور	مناطق اشتغلت	متوسط التقدّم	عامل-يوم	أيام توقف

التوقفات: انتظار تصريح ×1

حسب المقاول

المقاول	المناطق	التقدّم	التغيّر	متأخرة	عامل-يوم
Contractor B (Mech & Piping)	4	81%	+5%	2	32
Contractor A (Civil)	6	69%	+5%	2	62
Contractor C (Electrical)	1	40%	0%	1	0

إنجازات هذه الفترة

- A100 · Injection Manifold — دعامات الأنابيب منجز
- A300 · Shelter & Headers — نصب الهياكل الحديدية منجز
- C400 · Skid Foundations — أعمال الأساسات منجز
- P340 · Pipe Rack — أعمال الكراوت منجز
- A510 · Water Tank — تنصيب الخزانات منجز

التقدّم حسب المنطقة

المنطقة	البداية	النهاية	التغيّر	المخطط	عامل-يوم	توقف
A100 · Injection Manifold	72%	80%	+8%	متأخر -5	12	0
A200 · Pump House	78%	85%	+7%	متقدّم +5	16	0
A300 · Shelter & Headers	64%	70%	+6%	متأخر -5	9	0
C100 · Pump Foundations	52%	60%	+8%	متأخر -5	14	0
C400 · Skid Foundations	100%	100%	0%	—	0	0
P340 · Pipe Rack	70%	75%	+5%	متقدّم +0	11	0
E300 · Cable Trench	40%	40%	0%	متأخر -10	0	1
G300 · UG Fire Water Line	50%	55%	+5%	متأخر -5	8	0
A510 · Water Tank	100%	100%	0%	—	0	0
B400 · Control Building	58%	65%	+7%	متقدّم +5	24	0
Evaporation Pond	50%	50%	0%	—	0	0

آلية-يوم

خلاطة خرسانة · 2 | حفّارة · 1 | ماكينة لحام · 2 | صهريج ماء · 1 | شفل · 1 | حادلة · 1 | رافعة أفراد · 2 | رافعة · 2 | مضخة خرسانة · 1

الطقس

غبار ×1 · حار ×1

أعلى حرارة 41 °م

المشاكل والتأخير

3 انفتحت · 1 انغلقت · 2 بعدها مفتوحة

المشكلة	المنطقة	الحالة
Barriers missing along the open cable trench	E300 · Cable Trench	مفتوحة · 5 يوم
Waiting for GRP fittings delivery	A100 · Injection Manifold	مفتوحة · 2 يوم
Crane certificate expired	P340 · Pipe Rack	أغلقت 21 تشرين الثانى

الفحوصات والمواد

التاريخ	الفحص / المادة	المنطقة	النتيجة
21 تشرين الثانى	Concrete cubes 7-day — 31.5 MPa	B400 · Control Building	ناجح
21 تشرين الثانى	Field density test — 96 %	C100 · Pump Foundations	ناجح
21 تشرين الثانى	Holiday test on UG line	G300 · UG Fire Water Line	بالانتظار
21 تشرين الثانى	Rebar 16 mm — 12 t delivered	B400 · Control Building	واصلة

الخطوات الجاية (آخر خطة بالفترة)

A200 · Pump House: أعمال الكلادينك · أعمال الصبغ · Finish west elevation cladding
C100 · Pump Foundations: أعمال الحدل · صب الخرسانة · Field density test then blinding
E300 · Cable Trench: خندق الكابلات · Install barriers and signs before any work

قبل / بعد


A100 · Injection Manifold

قبل



21 تشرين الثانى · 07:41 · A100 · Injection Manifold · تنصيب الفالفات
GRP manifold and ball valves installed on bolted steel supports

بعد

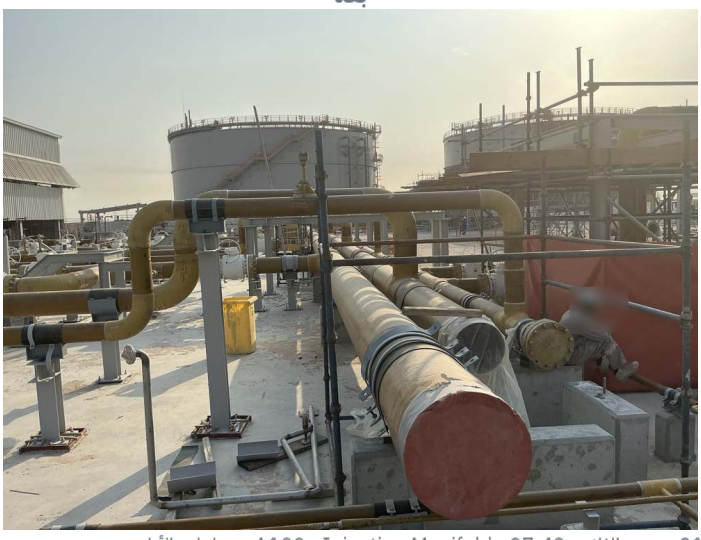

21 تشرين الثانى · 07:43 · A100 · Injection Manifold · دعامات الأنابيب
Supports bolted and levelled — ready for inspection

A200 · Pump House

قبل



19 تشرين الثانى · 08:10 · Pump House · A200 · نصب الهياكل الحديدية
Frames erected, cladding started

بعد



21 تشرين الثانى · 08:07 · Pump House · A200 · أعمال الكلادينك
East elevation fully clad

A300 · Shelter & Headers

قبل



19 تشرين الثانى · 10:30 · Shelter & Headers · A300 · نصب الهياكل الحديدية
Shelter steel erection

بعد



21 تشرين الثانى · 08:32 · Shelter & Headers · A300 · تنصيب البايبات
CS headers and GRP lines on pipe supports

C100 · Pump Foundations

قبل



19 تشرين الثانى · 09:00 · Pump Foundations · C100 · أعمال الأساسات
Pump block foundations stripped


بعد



21 تشرين الثانى · 09:12 · Pump Foundations · C100 · أعمال الحدل
Compaction around pedestal footings

P340 · Pipe Rack


قبل

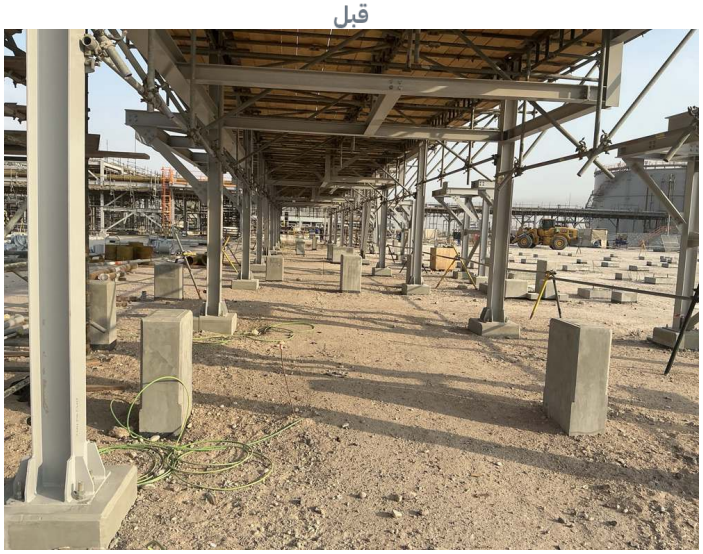

21 تشرين الثاني · 10:05 · Pipe Rack · P340 · أعمال الكراوت

Rack steel erected, base plates grouted

بعد

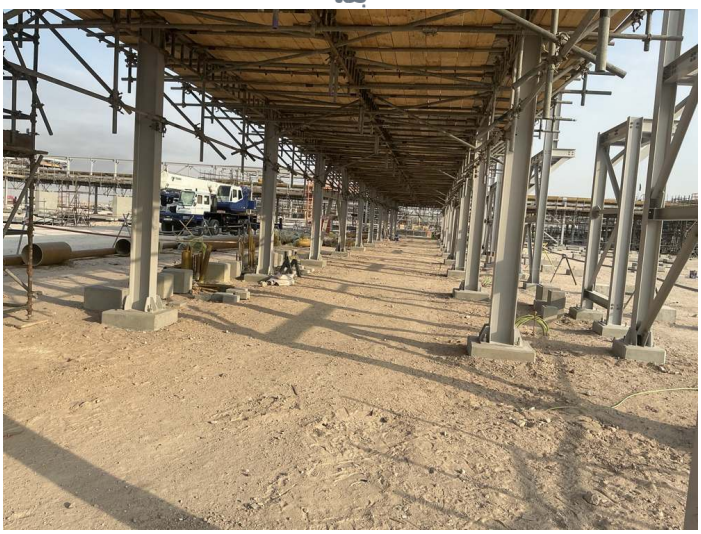

21 تشرين الثاني · 10:08 · Pipe Rack · P340 · نصب الهياكل الحديدية

Steel erected along the rack

B400 · Control Building

قبل



19 تشرين الثاني · 12:00 · Control Building · B400 · أعمال القوالب

Shoring in place for the roof slab

بعد



21 تشرين الثاني · 12:20 · Control Building · B400 · صب الخرسانة

RC frame and roof slab complete

أعدّه · مهندس الموقع
